

Partnering i Sydvattens Råvattenledning

2017-04-06



Råvattenledning, Äktaboden - Ringsjöholm



Sydvattens råvattenledning




Sydvattens råvattenledning - Projektet

- Budget 420 Mkr
- Längd 25 km
- Diameter DN1600 och DN1400
- GRP-rör (Glasfiberarmerad polyester)
- Över 100 tillstånd
- 60 markägare
- Passage Stambanan och Rönne å
- Totalentreprenad med partnering



Tidplan

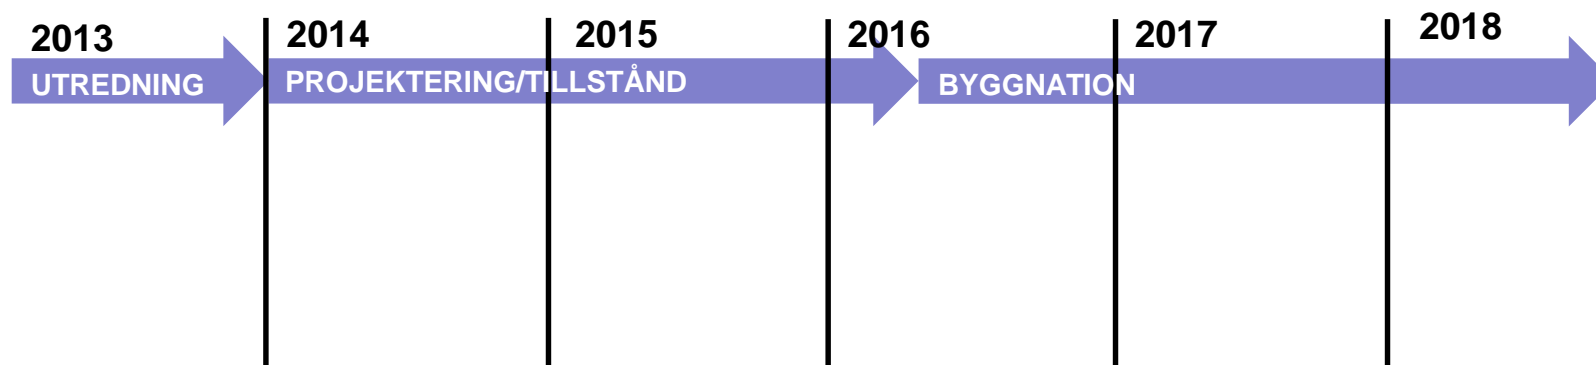

Råvattenledning – Status

- Etapp 1: 6,5 km färdigställda
- Etapp 2: ledningsrätt laga kraft 22/12 2016
- Etapp 3: påbörjad med minskade resurser
- Korsat Rönne å och stambanan
- Inkoppling Äktaboden klar
- Inkoppling Ringsjöholm ev sommaren 2017

Hur vi arbetar med samverkan

- Juridiskt stöd och partneringledare
- Upphandling av organisation
- Ersättningsmodell, bonus för beställarens mål
- NoGo innan entreprenadfasen
- Workshop för projektmål
- Partneringmöten (samverkan och ekonomi)

Ersättningsmodell

- Fas 1 projektering
 - Timarvode projektör

Motiv

Begränsade risker för entreprenören

Lagom driv mot effektivitet

Bonus mot mjuka parametrar

- Bonus för mjuka parametrar (3 % av riktkostnad)
 - 1 % Samverkan med tredje man
 - 1 % Kvalitet
 - 1 % Samverkan med beställaren

Råvattenledning – erfarenheter hittills

- Entreprenörens tidsuppfattning
- Ersättningsmodell med låg entreprenörsrisk
- Flexibelt
 - Entreprenör ansvarar för förutsättningar
 - Hantering av justerad tidplan
- Personalomsättning
 - Kunskap följer personen

Sydvattens råvattenledning

